


## Prüfungsvoraussetzungen

### Generalinspektion nach DIN 4040-100 für Fettabscheider zum Einbau ins Erdreich

Sehr geehrte Damen und Herren,

um eine zügige und problemlose Abwicklung der nach DIN 4040-100 geforderten Generalinspektion zu gewährleisten, übersenden wir Ihnen hiermit eine Checkliste, anhand welcher Sie prüfen können, ob alle Vorbedingungen für eine reibungslose Inbetriebnahme erfüllt sind. Bitte beachten Sie, dass zum Prüfetermin folgende Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um eine ordnungsgemäße Prüfung durchführen zu können:

#### Einbauvorschlag Anordnung

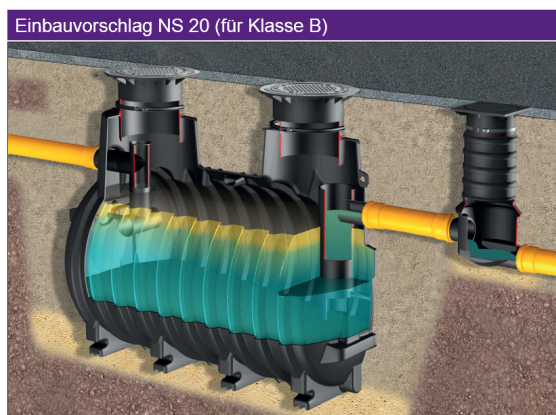

#### Prüfepiegel nach DIN: 2 cm unter Geländeoberkante



**Grundvoraussetzung ist eine in allen Belangen fertige und betriebsbereite Anlage**

**Anforderungen erfüllt:**

JA

#### 1. Anlagenvoraussetzungen

- 1.1. Anlage ist mit Schachtabdeckung auf endgültiges Endhöheniveau eingebaut, DIN konform verfüllt und verdichtet und in die Oberflächenversiegelung integriert
- 1.2. Anlage ist gemäß den Richtlinien des Herstellers verbaut und installiert
- 1.3. Anschlussrohrleitungen komplett verfüllt und verdichtet
- 1.4. Einläufe / Senkkästen angebunden und auf Endniveau gebracht
- 1.5. Optionales Schichtdickenmessgerät (Sonic Control) ist installiert und betriebsbereit<sup>1</sup>, Kabeleinbindung ist flüssigkeitsdicht ausgeführt (KESSEL-Durchführungsset verbaut)
- 1.6. Typenschild ist im Abscheiderschacht sichtbar montiert
- 1.7. Rückstausicherung eingehalten
- 1.8. Anlage ist zum Prüfungstermin vollständig entleert und gereinigt
- 1.9. DIN-konforme Durchlüftung eingehalten

Seite 1 von 2

Ersteller / Erstellt am: KD / 24.11.2023  
Änderungsdatum: -

Freigegeben durch: IMS-M  
Geprüft durch: Leitung KD

Revisionsstand: 1.0  
DE

**Vorstand**  
Stefan Grenzebach  
(Vorsitzender)  
Alexander Kessel  
Edgar Thiemt  
**Aufsichtsratsvorsitzender**  
Dieter R. Kirchmair

**Handelsregister**  
Amtsgericht Ingolstadt  
HRB 5304  
**Sitz der Gesellschaft**  
Lenting  
**USt-IdNr.**  
DE267242271

**KESSEL SE + Co. KG**  
Bahnhofstraße 31  
D-85101 Lenting

Tel +49 (0) 8456 27-0  
info@kessel.de

## 2. Dokumentation

- 2.1. Bedien- und Wartungsanleitung der Abscheideranlage
- 2.2. Betriebstagebuch vorhanden
- 2.3. Baurechtliche Zulassung und behördliche Genehmigungen der Anlage
- 2.4. Entwässerungsplan
- 2.5. Ggf. Sicherheitsdatenblätter der eingesetzten Reinigungsmittel
- 2.6. Protokolle zum Dichtheitsnachweis der zuführenden Rohrstränge<sup>2</sup>

## 3. Standortbedingungen

- 3.1. Anlagenbemessener Wasseranschluss (mind. 1 Zoll Schlauch, ab Nenngröße 7 mind. C-Schlauch) zur Befüllung des Abscheiders. Hierzu ist eine Person bauseits zu stellen.
- 3.2. Elektrische Versorgung 230 V für externe Prüfeinrichtung zum Abnahmeterminein
- 3.3. Zugänglichkeit der Anlage und den angeschlossenen Betriebsräumen gegeben
- 3.4. Während der Prüfung kann die Anlage nicht betrieben werden
- 3.5. Die Küche ist zum Prüfetermin vollständig eingerichtet und für den Prüfer zugänglich

<sup>1</sup> kann als kostenpflichtige Zusatzleistung beauftragt werden. Der Einbau muss vor dem Prüfetermin erfolgen.

<sup>2</sup> kann als kostenpflichtige Zusatzleistung beauftragt werden. Die Prüfung kann am Prüfetermin erfolgen.

Sollten o.g. Voraussetzungen zum Zeitpunkt der Prüfung nicht erfüllt sein und auf Grund dessen die Generalinspektion vor Inbetriebnahme nicht im vollen Umfang durchzuführen ist, werden die vollen Kosten in Rechnung gestellt. Eine Nachprüfung ist nicht im Preis enthalten. Diese muss erneut beauftragt werden und wird gesondert gemäß Prüfungspauschale berechnet. Ein eventuell anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet. Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und damit nicht rabattfähig.

Hiermit bestätige ich, dass ich die Checkliste vollständig gelesen habe und ALLE hausseitigen Voraussetzungen wie angegeben erfüllt sind.

\_\_\_\_\_  
Datum + Unterschrift

Ersteller / Erstellt am: KD / 24.11.2023  
Änderungsdatum: -

Freigegeben durch: IMS-M  
Geprüft durch: Leitung KD

Revisionsstand: 1.0  
DE

Seite 2 von 2

**Vorstand**  
Stefan Grenzebach  
(Vorsitzender)  
Alexander Kessel  
Edgar Thiemt  
**Aufsichtsratsvorsitzender**  
Dieter R. Kirchmair

**Handelsregister**  
Amtsgericht Ingolstadt  
HRB 5304  
**Sitz der Gesellschaft**  
Lenting  
**USt-IdNr.**  
DE267242271

**KESSEL SE + Co. KG**  
Bahnhofstraße 31  
D-85101 Lenting  
  
**Tel +49 (0) 8456 27-0**  
info@kessel.de

[www.kessel.de](http://www.kessel.de)
